


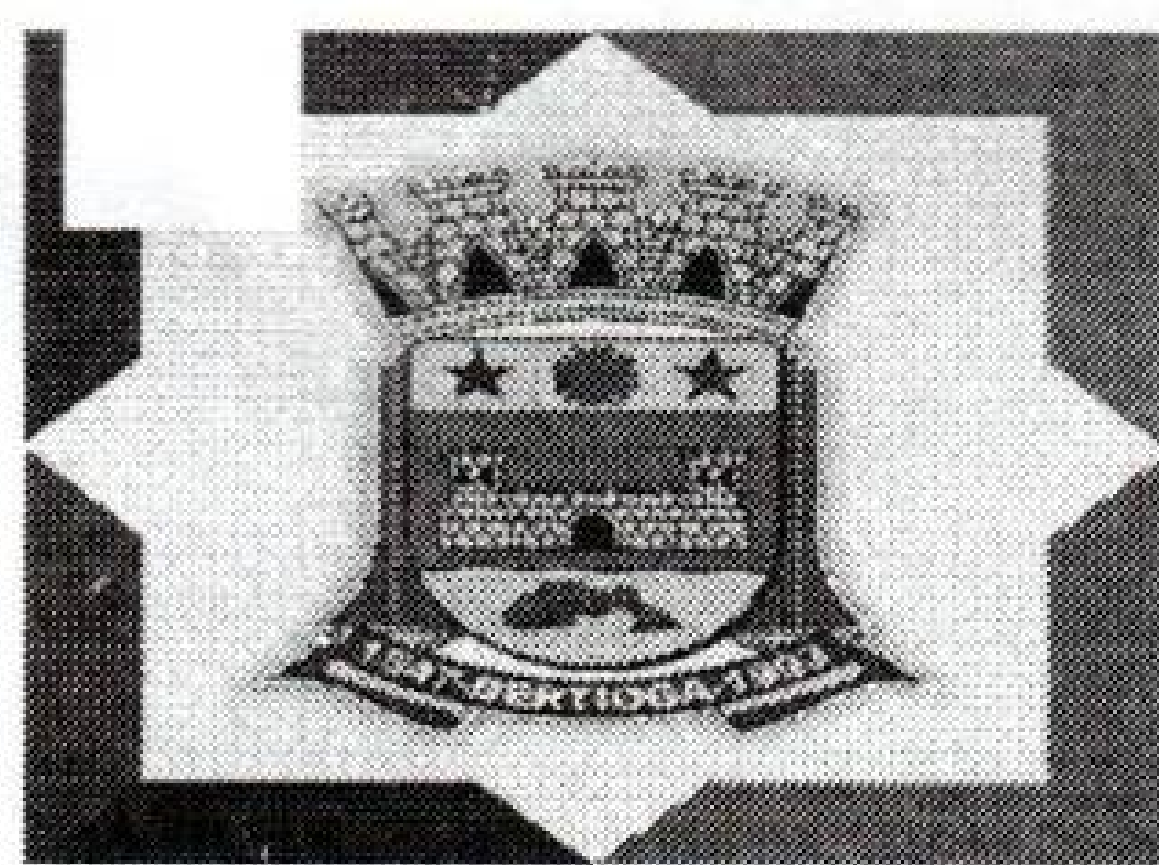

# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

## ADITIVO CONTRATUAL nº 018/2025 – P.A. 0480/2.023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2023


Pelo presente instrumento público de aditamento contratual, feito ao contrato administrativo n.º 008/2022, que para todos os efeitos legais o tornam público, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**, com personalidade judiciária de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o C.N.P.J. n.º 68.021.534/0001-38, com sede à Rua Reverendo Augusto Paes D'Avila n.º 374, Jardim Rio da Praia, Bertioga/SP, neste ato representada pelo seu Presidente, Ver. **Taciano Goulart Cerqueira Leite**, portador do RG n.º [REDACTED] e inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], doravante denominada de **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, empresa devidamente constituída, inscrita no Ministério da Fazenda sob o C.N.P.J. n.º 04.206.255/0001-66, com sede na Alameda Madureira n.º 162 – sala 02 e 03 – conjunto 304, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. **PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR**, portador do RG n.º [REDACTED] e CPF n.º [REDACTED], doravante denominada de **CONTRATADA**, tem entre si justo e acordado o que segue:

**Cláusula 1ª** – Nos termos das manifestações contidas no processo administrativo n.º 480/2.023, face as necessidades constatadas no transcorrer da execução contratual do contrato original, a planilha constante no Anexo I do termo aditivo 003/2024, processo administrativo 480/23 (fls. 444/454) fica substituída pela planilha constante do Anexo I deste termo aditivo, para fins de serviços suprimidos, substituídos e ou acrescidos.

**Cláusula 2ª** – Em razão do presente aditivo contratual o valor inicial do contrato administrativo n.º 034/2.023 já aditado pelo termo de aditamento 003/2024, fica acrescido em mais **R\$ 2.995.178,49** (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), que serão pagos através da efetiva realização do serviço, conforme medições decorrentes do cronograma físico-financeiro, que será entregue pela **CONTRATADA**.

**Cláusula 3ª** - Permanecem inalteradas, as demais cláusulas constantes do contrato inicial.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

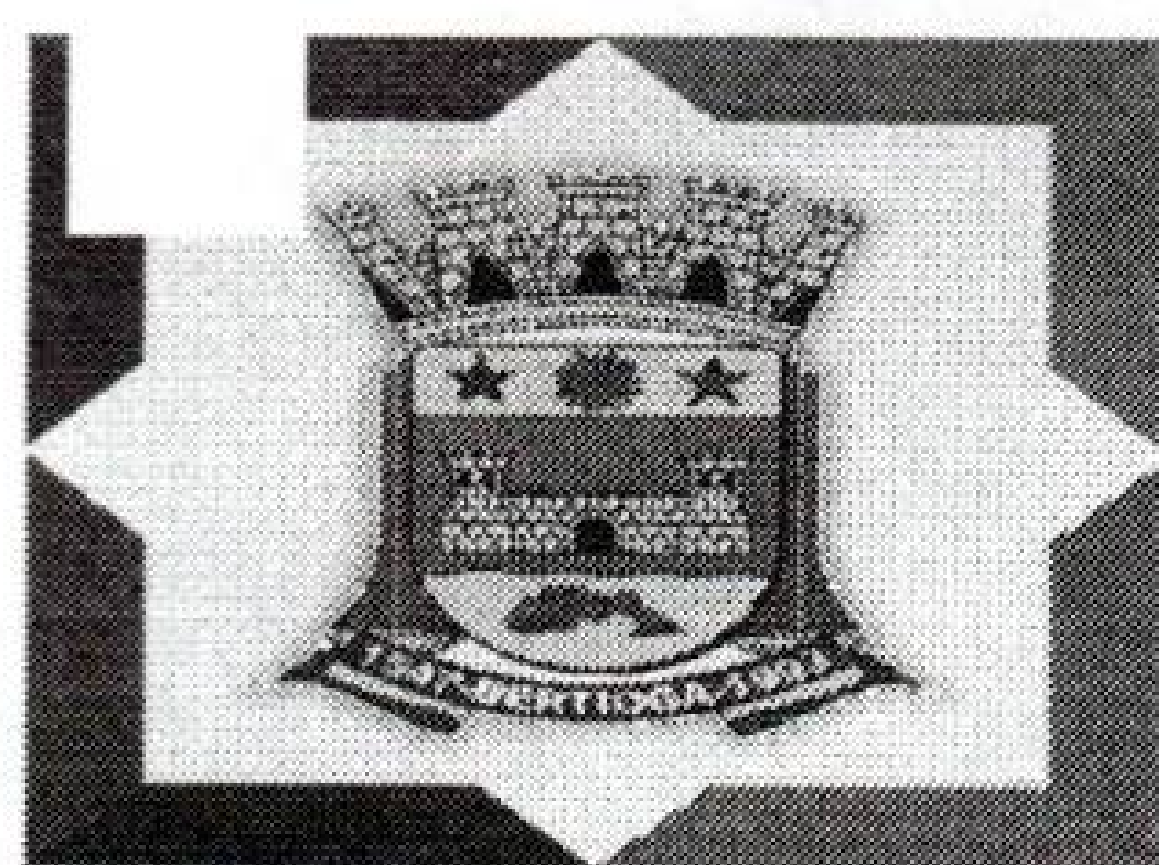

# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Bertiooga, 14 de julho de 2025

**CONTRATANTE - CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**  
Ver. Taciano Goulart Cerqueira Leite  
Presidente Interno da Câmara Municipal de Bertiooga

**CONTRATADA - CONSTRUISE ENGENHARIA E  
EMPREENDEIMENTOS LTDA.**  
Sr. PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR

**Testemunhas:**

1)

Nome:

*João Carlos Muniz*  
RG. [REDACTED]

2)

Nome:

*Sebastião L. Silva Jr.*  
RG. [REDACTED]

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

| <b>Dados da Obra</b>                                                                       |                                                                         |                  |                          |                |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Objeto</b> PROJETO DE VIABILIDADE DE USO ESPAÇO MULTIUSO / PLENÁRIO DOS VEREADORES      |                                                                         |                  |                          |                |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| <b>Local</b> RUA REVERENDO AUGUSTO PAES D'AVILA, 374 - JARDIM RIO DA PRAIA - BERTIOGA - SP |                                                                         |                  |                          |                |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| <b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REPLANILHAMENTO</b>                                    |                                                                         |                  |                          |                |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| Item                                                                                       | Descrição dos Serviços                                                  | TOTAL            | ACUMULADO PERÍODOS 1 A 6 | PERÍODO 7      | BALDO   | ADITAMENTO    |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  |                          |                |         | MÊS 19        | MÊS 20         | MÊS 21        | MÊS 22         | MÊS 23         | MÊS 24         | MÊS 25        | MÊS 26        | MÊS 27         | MÊS 28         | MÊS 29        |
| 01                                                                                         | EQUIPE TÉCNICA                                                          | R\$ 672.456,24   | 66,60%                   | 22,22%         | 11,18%  | 11,18%        |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 447.868,99           | R\$ 148.414,13 |         | R\$ 75.172,97 |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| 02                                                                                         | CANTEIRO DE OBRAS                                                       | R\$ 135.407,53   | 41,32%                   | 0,00%          | 58,68%  |               |                |               | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%        | 10,00%        | 8,68%          |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 55.955,75            | -R\$ 0,73      |         |               |                |               | R\$ 13.540,75  | R\$ 13.540,75  | R\$ 13.540,75  | R\$ 13.540,75 | R\$ 13.540,75 | R\$ 11.748,75  |                |               |
| 03                                                                                         | DEMOLIÇÃO                                                               | R\$ 121.567,12   | 100,00%                  | 0,00%          | 0,00%   |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 121.566,80           | R\$ 0,32       |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| 04                                                                                         | INFRAESTRUTURA                                                          | R\$ 195.404,10   | 100,00%                  | 0,00%          | 0,00%   |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 195.397,78           | R\$ 6,32       |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| 05                                                                                         | MURO DE CONTENÇÃO                                                       | R\$ 1.906.560,09 | 99,99%                   | 0,01%          | 0,00%   |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 1.906.459,78         | R\$ 100,31     |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| <b>BLOCO - CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DOS VEREADORES</b>                                       |                                                                         |                  |                          |                |         |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| 06                                                                                         | ESTACAS                                                                 | R\$ 2.000.917,98 | 100,00%                  | 0,00%          | 0,00%   |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 2.000.910,79         | R\$ 7,19       |         | R\$ 0,00      |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| 07                                                                                         | ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO                                                   | R\$ 617.028,13   | 99,99%                   | 0,01%          | 0,00%   |               |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 616.978,83           | R\$ 49,30      |         | R\$ 0,00      |                |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| 08                                                                                         | ESTRUTURAS                                                              | R\$ 4.509.285,77 | 81,14%                   | 9,69%          | 9,17%   |               | 9,17%          |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 3.658.975,87         | R\$ 436.813,25 |         | R\$ 0,00      | R\$ 413.496,65 |               |                |                |                |               |               |                |                |               |
| 09                                                                                         | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES                                          | R\$ 918.320,60   | 4,65%                    |                | 95,35%  |               |                | 10,00%        | 30,00%         | 30,00%         | 10,00%         | 10,00%        | 5,35%         |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 42.679,77            | -              |         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 91.832,06 | R\$ 275.496,18 | R\$ 275.496,18 | R\$ 91.832,06  | R\$ 91.832,06 | R\$ 49.152,29 |                |                |               |
| 10                                                                                         | ALVENARIA                                                               | R\$ 473.077,83   | 31,13%                   | 40,07%         | 28,80%  |               | 10,00%         | 10,00%        | 8,80%          |                |                |               |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 147.261,22           | R\$ 189.572,27 |         | R\$ 0,00      | R\$ 47.307,78  | R\$ 47.307,78 | R\$ 41.628,77  |                |                |               |               |                |                |               |
| 11                                                                                         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                   | R\$ 574.641,08   | 6,44%                    |                | 93,56%  |               |                | 10,00%        | 10,00%         | 10,00%         | 20,00%         | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%         | 5,00%          | 3,56%         |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 37.000,56            | R\$ -          |         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 57.464,11 | R\$ 57.464,11  | R\$ 57.464,11  | R\$ 114.928,22 | R\$ 57.464,11 | R\$ 57.464,11 | R\$ 28.732,05  | R\$ 28.732,05  | R\$ 20.463,55 |
| 12                                                                                         | REDE DE DADOS                                                           | R\$ 104.959,87   | 0,00%                    |                | 100,00% |               |                |               |                |                |                | 20,00%        | 20,00%        | 30,00%         | 20,00%         | 5,00%         |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ -                    | R\$ -          |         |               |                |               |                |                |                | R\$ 20.991,97 | R\$ 20.991,97 | R\$ 31.487,96  | R\$ 20.991,97  | R\$ 5.247,99  |
| 13                                                                                         | SPDA                                                                    | R\$ 46.641,53    | 0,00%                    |                | 100,00% |               |                |               |                |                |                | 20,00%        | 20,00%        | 30,00%         | 20,00%         | 5,00%         |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ -                    | R\$ -          |         |               |                |               |                |                |                | R\$ 9.328,31  | R\$ 9.328,31  | R\$ 13.992,46  | R\$ 9.328,31   | R\$ 2.332,08  |
| 14                                                                                         | CLIMATIZAÇÃO                                                            | R\$ 796.143,37   | 0,00%                    |                | 100,00% |               |                |               |                |                |                |               |               | 40,00%         | 40,00%         | 10,00%        |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ -                    | R\$ -          |         |               |                |               |                |                |                |               |               | R\$ 318.457,35 | R\$ 318.457,35 | R\$ 79.614,34 |
| 15                                                                                         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE               | R\$ 58.287,74    | 52,66%                   |                | 47,34%  |               |                | 10,00%        | 10,00%         | 10,00%         | 15,00%         | 2,34%         |               |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 30.692,92            | R\$ -          |         |               |                | R\$ 5.828,77  | R\$ 5.828,77   | R\$ 5.828,77   | R\$ 8.743,16   | R\$ 1.365,34  |               |                |                |               |
| 16                                                                                         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO                                | R\$ 67.488,21    | 0,00%                    |                | 100,00% |               |                |               |                |                |                |               | 10,00%        |                |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ -                    | R\$ -          |         |               |                | R\$ 13.497,64 | R\$ 20.246,46  | R\$ 13.497,64  | R\$ 6.748,82   | R\$ 6.748,82  | R\$ 6.748,82  |                |                |               |
| 17                                                                                         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CISTERNA | R\$ 405.963,30   | 93,36%                   |                | 6,64%   |               |                |               |                |                |                |               |               | 6,64%          |                |               |
|                                                                                            |                                                                         |                  | R\$ 379.017,66           | R\$ -          |         |               |                |               |                |                |                |               |               | R\$ 26.945,64  |                |               |

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 839

Data 14/07/25

Hora 17:13

Funcionário

Maria Clara de Silva

Técnico Legislativo Administrativo

Reg/661

CAMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

|                 |                                                        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 18              | ACABAMENTOS                                            | R\$ 2.998.234,75 | 4,52%            |                   | 95,48%            |                   |                   |                   |                   | 5,00%             | 5,00%             | 10,00%            | 30,00%            | 15,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,48%         |
|                 |                                                        |                  | R\$ 135.417,97   | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 149.911,74    | R\$ 149.911,74    | R\$ 299.823,48    | R\$ 899.470,43    | R\$ 449.735,21    | R\$ 299.823,48    | R\$ 299.823,48    | R\$ 314.317,24 |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 20,00%            | 10,00%            | 10,00%         |
| 19              | PORTAS E JANELAS                                       | R\$ 374.600,27   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 74.920,05     | R\$ 74.920,05     | R\$ 74.920,05     | R\$ 74.920,05     | R\$ 37.460,03     | R\$ 37.460,03  |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20,00%            | 30,00%            | 30,00%            | 20,00%            |                   |                |
| 20              | LOUÇAS E METAIS                                        | R\$ 136.862,42   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 27.776,48     | R\$ 41.664,73     | R\$ 41.664,73     | R\$ 27.776,48     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30,00%            | 30,00%            | 30,00%            | 10,00%         |
| 21              | COMBATE A INCÊNDIO                                     | R\$ 141.592,92   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 42.477,88     | R\$ 42.477,88     | R\$ 42.477,88     | R\$ 14.159,29  |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| 22              | ELEVADOR                                               | R\$ 0,00         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 50,00%            | 40,00%            | 10,00%         |
| 23              | POLTRONAS                                              | R\$ 355.656,00   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 177.828,00    | R\$ 142.262,40    | R\$ 35.565,60  |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00%        |
| 24              | LIMPEZA FINAL                                          | R\$ 18.787,58    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 18.787,58  |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| IMPLANTAÇÃO     |                                                        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| 25              | PAISAGISMO                                             | R\$ 4.754,31     | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 50,00%            | 50,00%            |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 2.377,16      | R\$ 2.377,16      | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 29,33%           |                   | 70,67%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 40,00%            | 30,67%            |                |
| 26              | PASSEIO                                                | R\$ 88.966,93    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ 26.094,31    | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 35.586,77     | R\$ 27.285,85     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 38,75%           |                   | 61,25%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 40,00%            | 21,25%            |                   |                   |                   |                |
| 27              | ESPELHO D'ÁGUA                                         | R\$ 61.568,75    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ 23.859,30    | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 24.627,50     | R\$ 13.081,95     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20,00%            | 30,00%            | 30,00%            | 20,00%            |                |
| 28              | CERCAMENTO                                             | R\$ 29.930,31    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 5.986,06      | R\$ 9.979,09      | R\$ 9.979,09      | R\$ 5.986,06      | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 40,00%            | 60,00%            |                   |                   |                |
| 29              | PASSARELA                                              | R\$ 27.163,35    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 10.865,34     | R\$ 16.298,01     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 25,12%           |                   | 74,88%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 50,00%            | 24,88%            |                   |                |
| 30              | ABRIGOS                                                | R\$ 22.852,44    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ 5.691,19     | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 11.326,22     | R\$ 5.635,03      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 74,76%           |                   | 25,24%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20,00%            | 5,24%             |                |
| 31              | MURO PERIMETRAL                                        | R\$ 71.252,67    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ 53.271,24    | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 14.250,53     | R\$ 3.730,90      | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00%        |
| 32              | LIMPEZA FINAL                                          | R\$ 10.328,56    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 10.328,56  |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 82,97%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| 33              | LAJE INCLINADA DO PLENÁRIO                             | R\$ 718.412,79   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ 596.057,34    |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 122.355,45    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 40,00%            | 40,00%            | 20,00%            |                |
| 34              | ELEVADORES                                             | R\$ 1.027.402,14 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 410.960,86    | R\$ 410.960,86    | R\$ 205.480,43    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 6,20%             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20,00%            | 20,00%            | 33,80%            |                   |                |
| 35              | REVESTIMENTO EXTERNO                                   | R\$ 264.330,08   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ 16.390,62     |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 52.866,02     | R\$ 52.866,02     | R\$ 52.866,02     | R\$ 89.341,41     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                |
| 36              | NOVA PASSARELA TÉCNICA                                 | R\$ 70.840,66    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 70.840,66     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30,00%            | 30,00%            | 30,00%            | 10,00%            |                   |                |
| 37              | ADIÇÃO DE CONTRAPISO ACÚSTICO PARA AS ÁREAS INTERNAS   | R\$ 140.206,58   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 42.061,97     | R\$ 42.061,97     | R\$ 42.061,97     | R\$ 14.020,66     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 10,04%            |                   |                   |                   | 30,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 9,96%             |                   |                   |                   |                   |                |
| 38              | NOVA ÁREA DE AUDITÓRIO E ACESSOS - NÍVEL INTERMEDIÁRIO | R\$ 477.090,98   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ 47.882,56     |                   | R\$ 143.127,29    | R\$ 47.709,10     | R\$ 47.709,10     | R\$ 47.709,10     | R\$ 47.709,10     | R\$ 47.709,10     | R\$ 47.535,64     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 50,00%            | 50,00%            |                   |                   |                   |                |
| 39              | GERADORES                                              | R\$ 262.827,18   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ -             |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 131.413,59    | R\$ 131.413,59    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 12,24%            |                   |                   |                   |                   | 50,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 5,00%             | 2,76%             |                   |                |
| 40              | MODIFICAÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL INCLINADO            | R\$ 337.649,72   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|                 |                                                        |                  | R\$ -            | R\$ 41.326,16     |                   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 168.824,86    | R\$ 33.764,97     | R\$ 33.764,97     | R\$ 33.764,97     | R\$ 16.882,49     | R\$ 9.319,30      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       |
|                 |                                                        |                  | 0,00%            |                   | 100,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
| TOTAL MENSAL    |                                                        |                  | R\$ 1.477.621,04 |                   | R\$ 218.300,26    | R\$ 508.513,53    | R\$ 244.313,05    | R\$ 788.407,61    | R\$ 854.931,17    | R\$ 781.277,44    | R\$ 770.221,82    | R\$ 1.714.115,62  | R\$ 1.551.815,19  | R\$ 1.264.343,66  | R\$ 650.044,35    | R\$ 538.276,26    |                |
| TOTAL ACUMULADO |                                                        |                  | R\$ 9.885.100,73 | R\$ 11.362.721,77 | R\$ 11.581.022,03 | R\$ 12.089.535,57 | R\$ 12.333.848,61 | R\$ 13.122.256,23 | R\$ 13.977.187,39 | R\$ 14.758.464,84 | R\$ 15.528.686,65 | R\$ 17.242.802,27 | R\$ 18.794.617,46 | R\$ 20.058.961,12 | R\$ 20.709.005,47 | R\$ 21.247.281,88 |                |
